

Las actividades relacionadas con la Intersección en Michigan incluyen mejoras a calles locales.

Reconstrucción y realineación de:

- Green Street desde la I-75 hasta W. Jefferson Avenue, incluido un bulevar desde Norfolk Southern Railway hasta W. Jefferson Avenue (en marcha)
- Campbell Street desde la I-75 hasta W. Jefferson Avenue, incluido un bulevar desde Norfolk Southern Railway hasta W. Jefferson Avenue (completada)
- Livernois Avenue desde la I-75 hasta el final de la calle sin salida, con la construcción de una calle sin salida y conversión a tráfico de doble sentido a partir de Fort Steet hacia el sur(en marcha)



Reconstrucción y reconfiguración de las siguientes intersecciones:

- West End Street y Fort Street (completada)
- West End Street y W. Jefferson Avenue (completada)
- Dearborn Street y W. Jefferson Avenue
- Clark Street y Fort Street (completada)
- Clark Street y W. Jefferson Avenue (completada)


Se realizará repavimentación de la superficie en :

- Las vías laterales de la I-75 (Service Drives) desde West End Street hasta Clark Street (en marcha)
- Fort Street, desde Junction Avenue hasta Green Street (en marcha)
- Cavalry Street: construcción de una nueva calle sin salida en el extremo sur
- W. Jefferson Avenue, desde Campbell Street hasta West End Street (en marcha).

ETAPAS Y CRONOGRAMA DE MEJORAS A LA CALLE DE FORT STREET

Se está repavimentando Fort Street desde Green Street hasta Junction Street como parte de las mejoras a las calles locales, parte del proyecto. Esto incluirá la repavimentación del camino así como la reconstrucción de bordillos, aceras y carriles para bicicletas. Este trabajo se está llevando a cabo en etapas lo cual requiere el cierre de carriles. Se prevé que el trabajo a lo largo de esta sección de Fort Street esté terminado en la primavera de 2025 y las actividades que se llevarán a cabo son las siguientes:

- Los carriles exteriores entre Green Street y Waterman Street están completos. El tráfico se desviará a los carriles recién construidos para dar cabida a la construcción de una isleta central en esta sección.
- Se está realizando la pavimentación de asfalto en la intersección de Fort Street con Campbell Street.
- Se está llevando a cabo la reconstrucción de aceras y bordillos entre Waterman Street y Campbell Street. Se han cerrado carriles para facilitar este trabajo y se mantiene el tráfico en ambas direcciones.

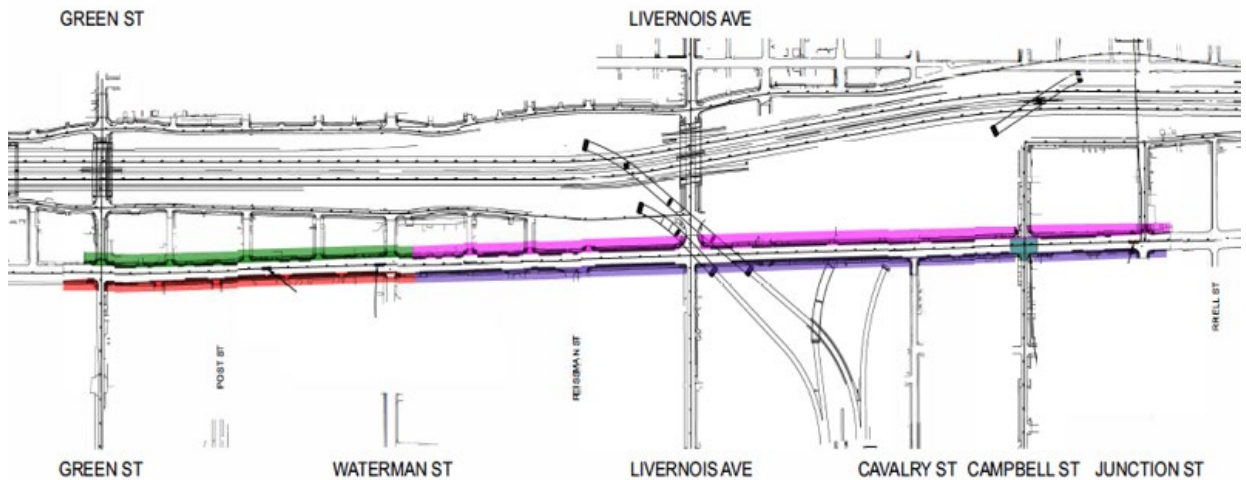

Para obtener información adicional sobre el proyecto del Puente Internacional Gordie Howe visite www.GordieHoweInternationalBridge.com o llame al 1-844-322-1773. Síguenos en X en www.x.com/GordieHoweBrg, conviértase en fan en Facebook en www.facebook.com/GordieHoweBridge y póngase en contacto con nosotros en LinkedIn en www.linkedin.com/company/wdba-apwd
