

Les activités réalisées dans le cadre de l'échangeur du Michigan comprennent l'amélioration des infrastructures routières locales :

La reconstruction et la reconfiguration de :

- la rue Green, entre l'I-75 et l'avenue W. Jefferson, y compris un boulevard depuis le chemin de fer de la Norfolk Southern Railway jusqu'à l'avenue W. Jefferson (**en cours**)
- la rue Campbell, entre l'I-75 jusqu'à l'avenue W. Jefferson, y compris un boulevard depuis le chemin de fer de la Norfolk Southern Railway jusqu'à l'avenue W. Jefferson (**terminé**)
- l'avenue Livernois, de l'I-75 à l'impasse, avec la construction d'un cul-de-sac et la conversion vers une circulation bidirectionnelle au sud de la rue Fort) (**en cours**)



La reconstruction et reconfiguration des intersections suivantes :

- Rue West End et rue Fort (**terminé**)
- Rue West End et avenue W. Jefferson (**terminé**)
- Rue Dearborn et avenue W. Jefferson
- Rue Clark et rue Fort (**terminé**)
- Rue Clark et avenue W. Jefferson (**terminé**)


L'asphaltage de la chaussée aura lieu sur :

- les voies de desserte de l'I-75 en direction du nord et du sud, entre la rue West End et la rue Clark (**en cours**)
- la rue Fort, de l'avenue Junction à la rue Green (**en cours**)
- la rue Cavalry : construction d'un nouveau cul-de-sac au terminus sud
- l'avenue W. Jefferson, entre la rue Campbell et la rue West End (**en cours**)

ÉTAPES ET CALENDRIER DES TRAVAUX D'AMÉLIORATION DE LA RUE FORT

L'asphaltage de la rue Fort, de la rue Green à la rue Junction, fait partie des améliorations apportées aux routes locales dans le cadre du projet. Ces travaux comprennent le repavage de la route ainsi que la reconstruction des bordures, des trottoirs et des pistes cyclables. Ces travaux sont réalisés par étapes et nécessitent des fermetures de voies. Les travaux le long de cette section de la rue Fort devraient être terminés au printemps 2025 et les activités en cours sont les suivantes :

- Les voies extérieures entre la rue Green et la rue Waterman sont terminées. La circulation sera transférée sur les voies nouvellement construites pour permettre la construction d'un îlot central dans cette section.
- Les travaux d'asphaltage sont en cours à l'intersection des rues Fort et Campbell.
- La reconstruction des bordures et des trottoirs est en cours entre les rues Waterman et Campbell. Des fermetures de voies sont en place pour permettre la réalisation de ces travaux, la circulation étant maintenue dans les deux sens.

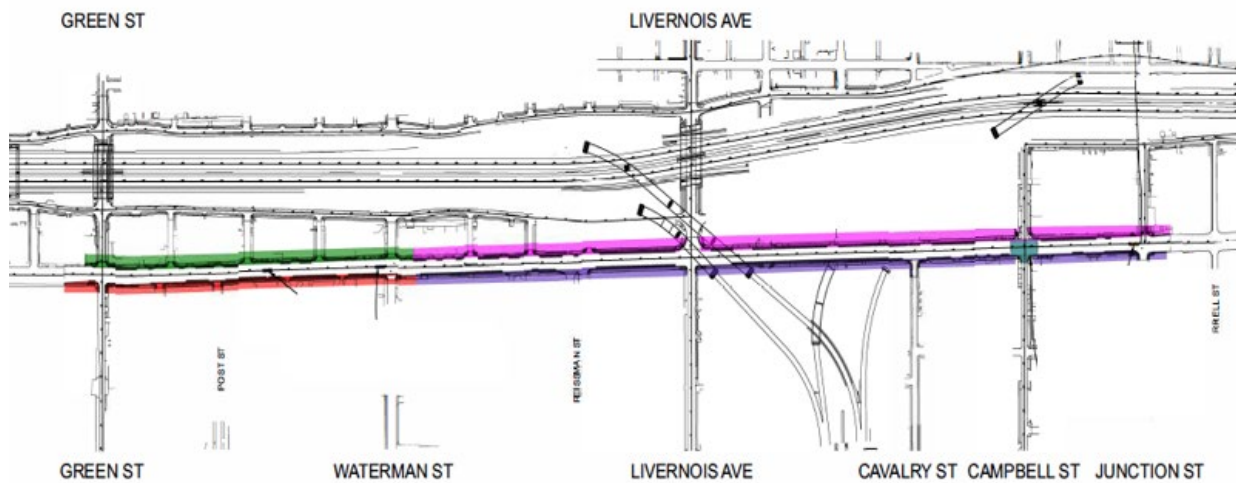

Pour de plus amples renseignements sur le projet du Pont international Gordie Howe, visitez le site www.gordiehoweinternationalbridge.com ou composez le 1 844 322-1773. Suivez-nous sur X : www.x.com/GordieHoweBrg, aimez notre page sur Facebook : www.facebook.com/GordieHoweBridge et connectez-vous avec nous sur LinkedIn : www.linkedin.com/company/wdba-apwd
